

Bilan du 2nd PPI 2023-2026

Les engagements financiers du 2nd PPI sont dépassés

Bilan financier prévisionnel sur les priorités de la concession (M€)	PPI 2023-2026	Dont réalisé à fin 05/2026	% de réalisation à fin 05/2026
II. Investissements pour l'amélioration du patrimoine	9 M€	9,5 M€	107 %
<i>Dont investissements pour la performance du réseau HTA</i>	5,2 M€	5,7 M€	110 %
<i>Dont investissements pour la performance du réseau BT</i>	3,8 M€	3,8 M€	100%
Total de l'engagement (M€)	9 M€		

Les indicateurs techniques identifiés dans le 2ND PPI


Programme pluriannuel d'investissements pour la période 2023-2026 (4 ans) en priorisant les zones identifiées	Prévu PPI 2023-2026	Réalisé à fin 05/2026	PdS prévision nel 2026
Fiabilisation BT fils nus	18 km	17,3 km	19 km
Sécurisation bourgs >1500 Hab	2	3	3
Fiabilisation HTA aérien	95 km	136,3 km	140 km
Renouvellement ou ajout d'OMT	5 OMT	9 OMT	9 OMT


L'engagement de résorption de fils nus du TE Flandre dans le cadre de l'article 8 atteint

Travaux d'article 8 sous MOA TE Flandre	Prévu PPI 2023-2026	Réalisé 2023-2025	Prévisionnel 2026	PdS prévisio nnel 2026
Dépose BT fils nus dans le cadre des travaux sous maitrise d'ouvrage TE Flandre	5 km	5,13 km	1,07 km	6,2 km
Total prévisionnel des déposes de fils nus	≈			


Localisation des travaux réalisés dans le cadre du PPI

Légende

-  Aérien BT
-  Souterrain BT
-  Poste DP
-  Enfouissement aérien HTA
-  RP
-  Souterrain HTA
-  OMT
-  Bourg Sécurisé

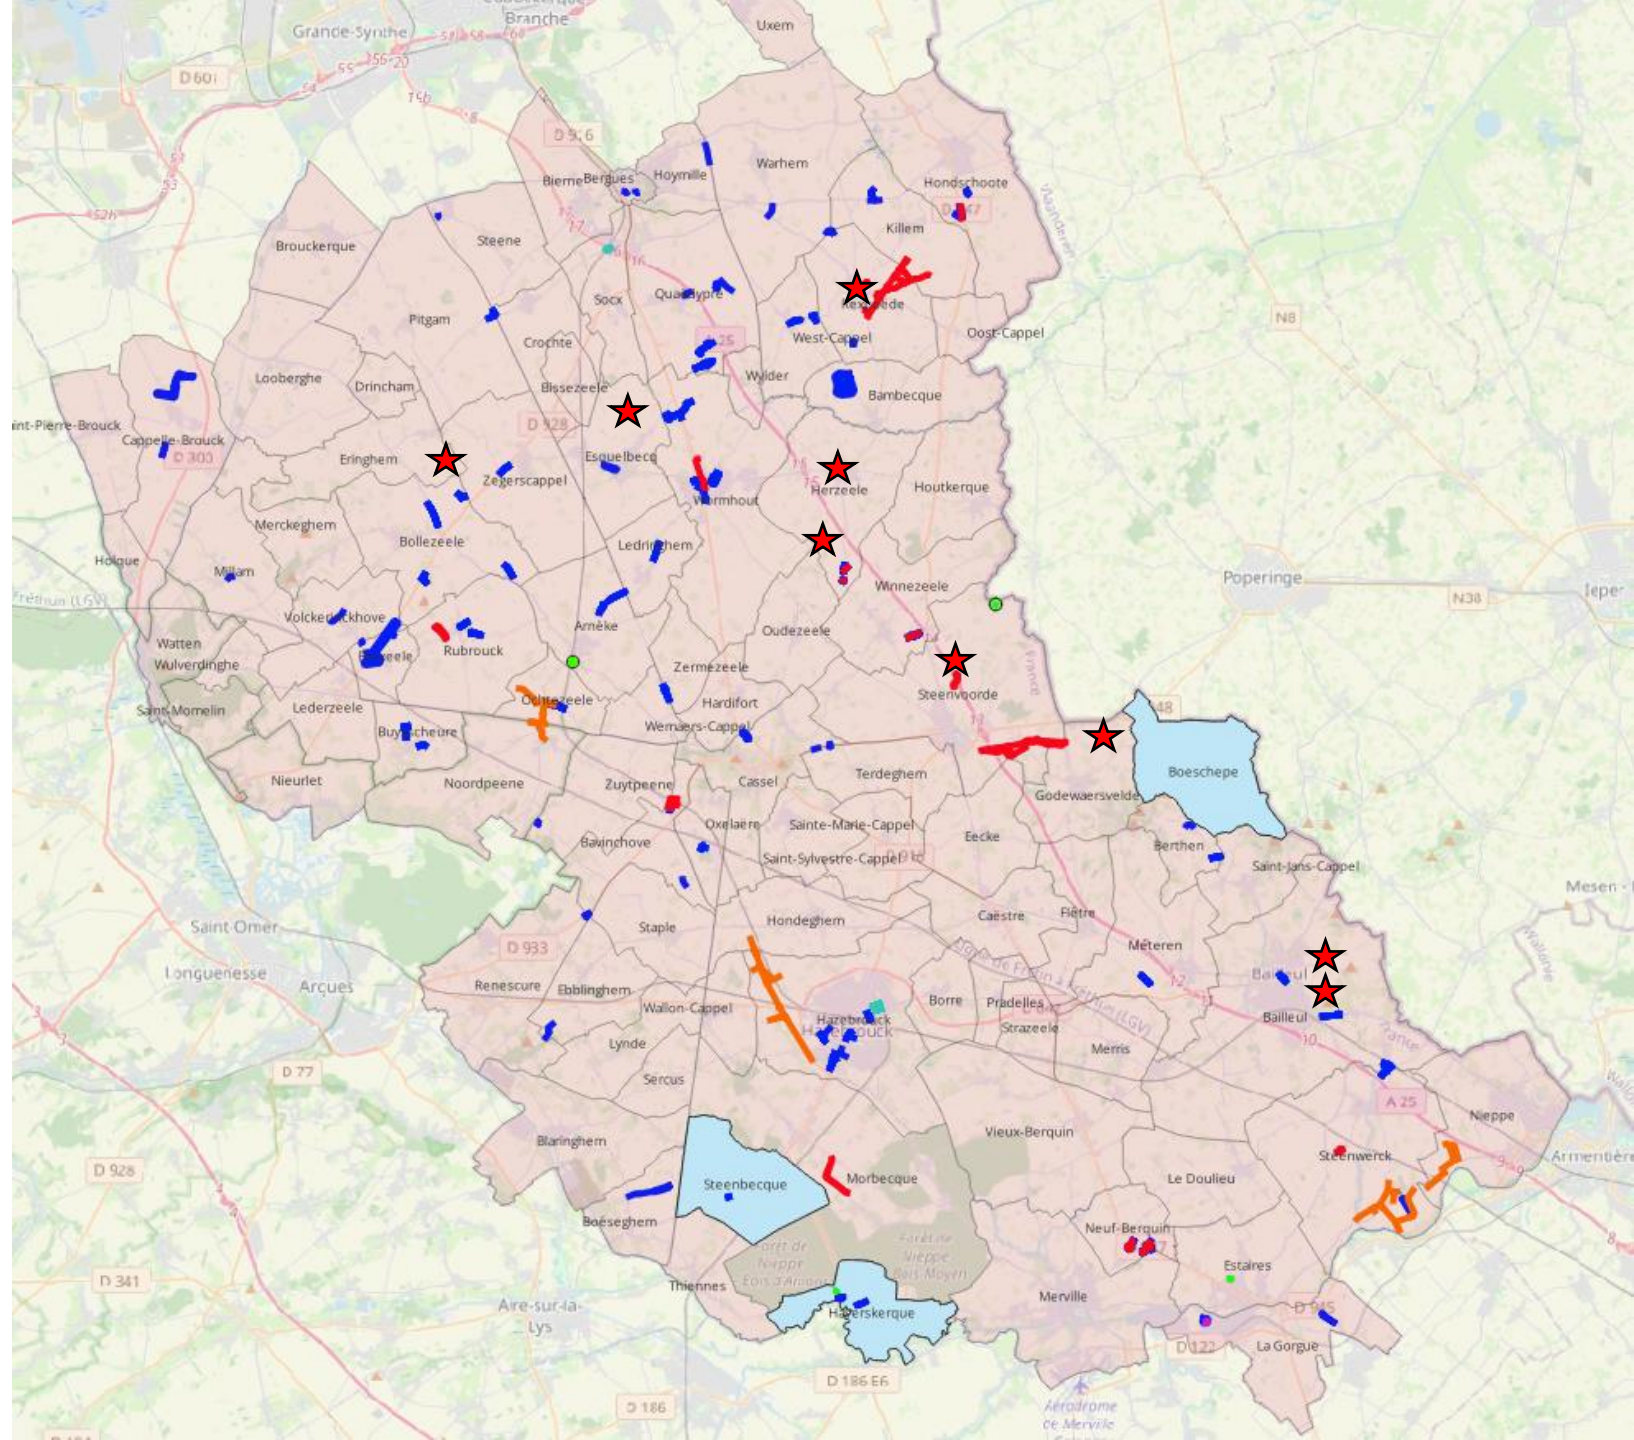

En synthèse, un second PPI réussi




Risques identifiés dans le diagnostic

- **Critère B TCC 2023-2025 de 70 minutes vs 133 minutes 2019-2022** (153,2 min 2017-2021 vs 211 min 2013-2017)
- Un stock de fils nus BT de 76 km à fin 2025, en **baisse de 24 KM hors correction d'inventaire** sur la durée du PPI2
- Une satisfaction clientèle **en hausse ou stable** à maille DR




Valeurs repères du SDI

- Les 4 valeurs repères du SDI **sont en avance / point de passage**



Engagements financiers

- L'engagement financier global du PPI **est atteint**



Indicateurs techniques

- Les 4 indicateurs techniques **sont en ligne**
