

 Sorégies Groupe	RAPPORT MENSUEL DE PRODUCTION		oct 25
	7025 - Ecole - CHAMPAGNE SAINT HILAIRE		
Rédacteur	Vérification	Date	
Marc Guillot-Gazeau	Thierry ROCHEREAU	15/12/2025	



Commentaires:

1. Synthèse mensuelle

Caractéristiques du parc		Résultats	oct		Cumulé annuel	
			[MWh]	[Euros]	[MWh]	[Euros]
Nombre de systèmes:	1	Budget:	3	2 010	54	33 834
Surface totale [m2]:	392	Production:	4	2 750	54	33 492
Puissance totale [kWc]:	55	Ecart:	37 %	37 %	-1 %	-1 %
Ensoleill. mensuel/normal:	116 %	Gisement:	4		56	
Ensoleill. cumulé/normal:	109 %	Perf. du parc:	125 %		96 %	

Production : énergie relevée au compteur sur la période

Budget : énergie estimée en prévision budgétaire annuelle:

Gisement (PV) : productible installateur x coefficient d'ensoleillement

Mois	Valeurs mensuelles [MWh]			Valeurs cumulées [MWh]		
	Production	Budget	Gisement	Production	Budget	Gisement
janv.	2,2	1,5	1,6	2,2	1,5	1,6
févr.	3,5	2,6	3,2	5,7	4,2	4,8
mars	5,2	4,4	4,5	10,9	8,5	9,2
avr.	6,1	5,8	5,9	17,0	14,4	15,1
mai	7,0	7,4	8,3	23,9	21,8	23,4
juin	7,1	8,7	9,5	31,0	30,5	33,0
juil.	6,9	8,2	7,7	38,0	38,7	40,7
août	6,4	7,1	7,2	44,4	45,8	47,9
sept.	4,7	5,1	4,5	49,1	50,9	52,4
oct.	4,4	3,2	3,5	53,5	54,1	55,9
nov.		1,8			55,9	
déc.		1,3			57,2	

2. Analyse

Commentaires

Pour le mois de octobre 2025 :

L'écart de production (mensuel) par rapport au budget (mensuel) est de : 37%.

L'écart de production (annuel) par rapport au budget (annuel) est de -1%.

La performance du parc est de 125%. C'est-à-dire que la production est supérieure de 25.0% par rapport au gisement météo.

La performance cumulée annuelle est de 96%.

L'ensoleillement mensuel est de 116%, c'est-à-dire que la puissance radiative est supérieure de 16.0% par rapport aux normales historiques de Météo France.

Avec un taux d'ensoleillement favorable au mois de octobre, la production atteint le budget attendu.

Elle représente 7.69% du budget annuel.

Evènements

RAS

Sécurité


RAS

Environnement


RAS

3. Production de l'ensemble du parc

Comparaison production, budget, gisement en MWh (parc total)

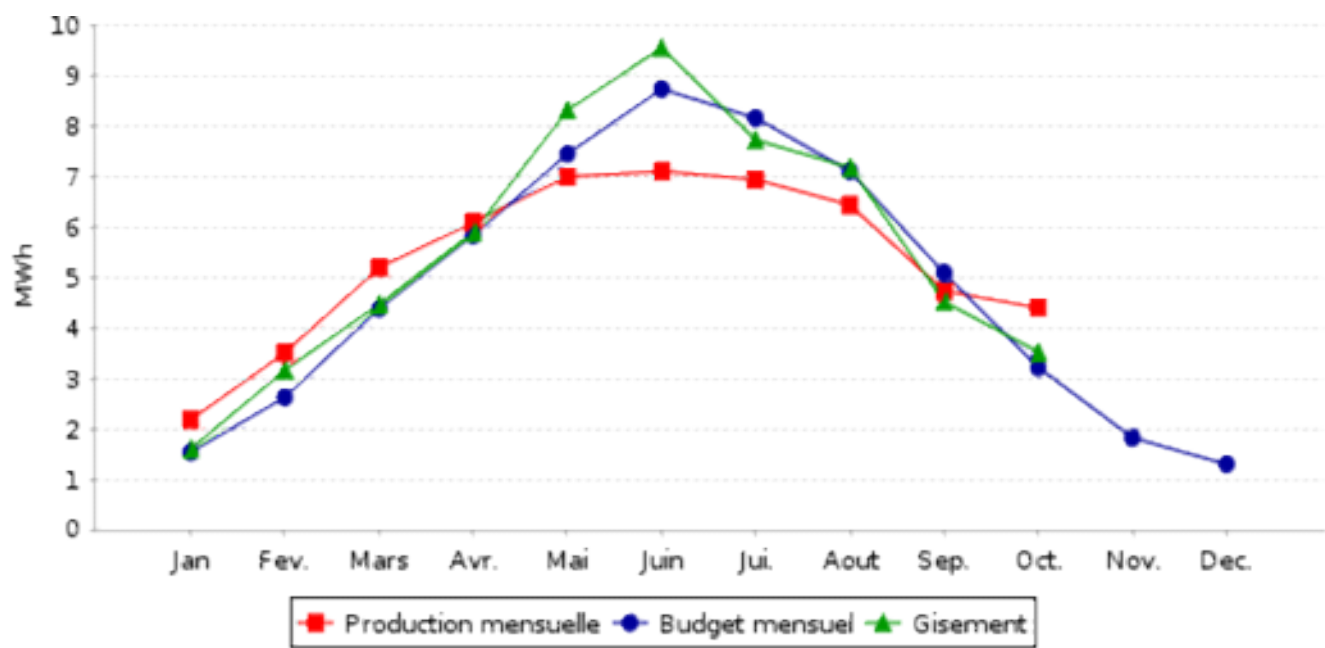

Cumul production, budget, gisement en MWh (parc total)

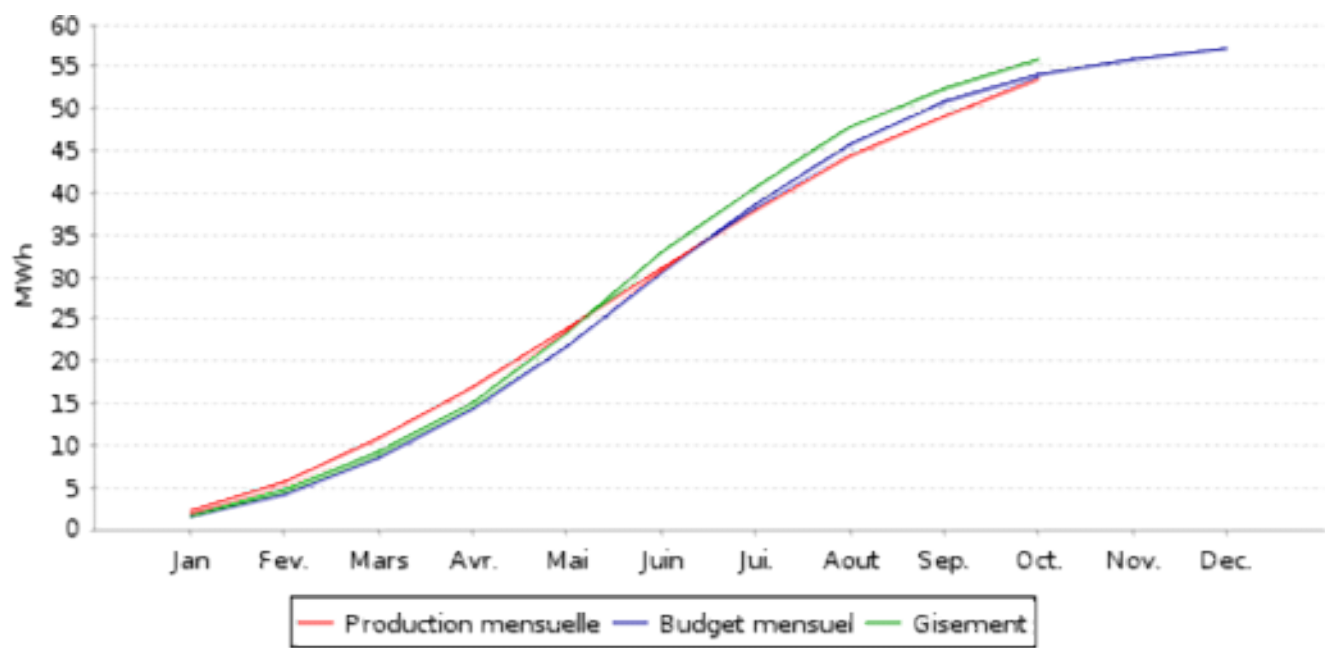

4. Performance des installations

Performance par installation (production/gisement)	Mois	Année
7025 - Ecole - CHAMPAGNE ST HILAIRE	125 %	96 %
