

RÉSULTATS D'ESSAIS

INTERVENTION 2017-C-0007	le 22/02/2017
PR départ -	PR arrivée -

Module sous chargement dynamique	NF P 94-117-2
Essai réalisé le 22/02/2017 à 15:26 par M. BOUIX Vincent, validé par M. BOUIX Vincent	

Sens des mesures	-	Nature du matériau	-
Epaisseur de la couche	-	Altimétrie	-

CARACTERISTIQUE DE REFERENCE

Classe

PF 2

MESURES

Type d'appareil utilisé

Dynaplaque 2

N°	P.R	R (%)	E (MPa)	Classe P.F.	Observations
1	N°1	-	53	PF 2	-
2	N°2	-	62	PF 2	-
3	N°3	-	87	PF 2qs	-
4	N°4	-	63	PF 2	-
5	N°5	-	73	PF 2	-
6	N°6	-	71	PF 2	-
7	N°7	-	61	PF 2	-
8	N°8	-	65	PF 2	-
9	N°9	-	82	PF 2qs	-
10	N°10	-	50	PF 2	-
11	N°11	-	81	PF 2qs	-
12	N°12	-	56	PF 2	-
13	N°13	-	64	PF 2	-
14	N°14	-	51	PF 2	-
15	N°15	-	78	PF 2	-
16	N°16	-	82	PF 2qs	-
17	N°17	-	71	PF 2	-
18	N°18	-	58	PF 2	-
19	N°19	-	53	PF 2	-
20	N°20	-	70	PF 2	-

SYNTHESE

	R (%)	E (MPa)	Classe P.F.	
Nombre de valeurs		20		
Moyenne	-	66.55	-	
Maximum	-	87	PF 2qs	
Minimum	-	50	PF 2	

RESULTAT DU CONTROLE

Résultats conformes à la contrainte PF 2.



Département de la Drôme

Direction des Déplacements

Service
Entretien Exploitation
de la Route et Matériel

Pôle
Laboratoire & chaussées

RAPPORT D'ESSAIS	Rapport N°
	LD26-2017-0055
	en date du
	24/02/2017

RÉFÉRENCE DU CHANTIER			
Demandeur	SAS TLM TP	Dossier N°	17-29-P69
Maître d'ouvrage	-	Maître d'œuvre	-
Chantier/Ouvrage	SCI "LE CLOS DES CHENES" COMMUNE DE MEYSSE	Type d'intervention	Contrôle
Partie/Couche/Phase	COUCHE DE FORME	-	-

Contrôles réalisés in situ	
2017-C-0007	
Module sous chargement dynamique	NF P 94-117-2

Destinataire(s) du rapport d'essai :
M. BOGUERRA YACINE, SAS TLM TP

52 rue Léon Gaumont
26000 Valence


Téléphone :
04 75 78 11 97
Télécopie :
04 75 78 11 87

vendredi 24 février 2017

Technicien

M. BOUIX Vincent

AVERTISSEMENT : La reproduction de ce rapport d'essai(s) n'est autorisée que sous forme de fac-similé intégral.
INTERPRÉTATION DES RESULTATS : Les portées(s) et conclusion(s) à lier des résultats font l'objet d'un document séparé si le donneur d'ordre en a fait la demande.
REPRESENTATIVITE : Ce rapport d'essai(s) atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis à essai(s) et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas un certificat de qualification d'un ensemble de matériaux ou produits.

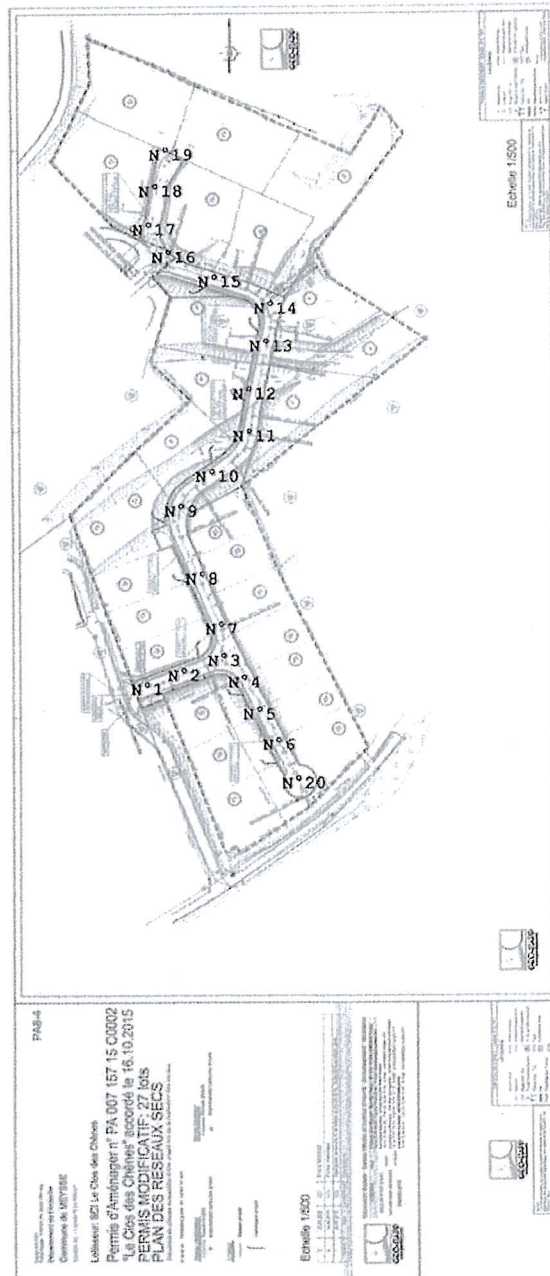

SCI le Clos des Chenes à Meysse

