



E. PONCELET - SOMVILLE
ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
XIV rue du GROS GERARD 59000 LILLE
TEL. : 03.20.31.58.81

NORD

STEENE

EGLISE SAINT - MARTIN

34214

3

RAPPORT de CHANTIER

Le 25 novembre 2020

1

PRESENTS

M. Sauvage, Adjoint au Maire
M. Verrielle, Responsable des Services Techniques
M. Laverat, CSPS
MM Heux et Blondel (Ent. Chevalier Nord)
M. Alain Waelens (Ent. Réatub)
M. Bouchard (Ent. Battais Charpente)
M. Carré (Ent. René Carré)

Absent excusé :
M. Davroux, Maire

DIFFUSION

M. Davroux, Maire
M. Sauvage, Adjoint au Maire
M. le Curé
M. Le Moine (CRMH Hauts-de-France)
UDAP Nord
Chantiers MH Nord
M. Pilté, Economiste
M. Laverat, CSPS
Ent. Chevalier Nord
Réatub
Battais Charpente
René Carré

Entreprise CHEVALIER NORD

- Effectif : Trois maçons au travail sur la frise d'arcatures du clocher.
- Le produit anti-mousse a été posé.
- Les joints sont en cours de dégradation.
- Les joints seront réalisés à partir des témoins en place (chaux blanche, inclusion de charbon de bois).
- La dépose du cadran d'horloge est à prévoir sous réserve de la décision de la mairie. Un cadran plus petit pourrait être placé sur le côté, selon le principe que nous avons réalisé sur le clocher de Watten.
- En cas de dépose du cadran, l'arcature sera refaite et les larmiers en briques des deux fenêtres adjacentes complétés.
- L'entreprise envisage deux semaines de travail sur ces arcatures.
- L'échafaudage du clocher pourra être déposé aussitôt.

Entreprise RENÉ CARRÉ

- La découverte de la flèche de la tourelle devra être faite dès que possible pour permettre à l'entreprise BATTAIS CHARPENTE d'intervenir.
- Le voligeage de la tourelle et le bardage provisoire devront être terminés avant les congés de l'entreprise (prévus du 18 décembre 2020 au 11 janvier 2021).
- La girouette de la flèche sera déposée avec soin en vue d'une réparation selon les témoins (voir dessin). Les lettres N et E seront restituées en cuivre découpé et plié. L'axe recevra un étendard en cuivre 10/10° découpé orné du M marial inspiré d'un modèle néo-gothique (racine de l'arbre de Jessé et fleur lys). Un contrepoids en plomb gainé de cuivre permettra de maintenir l'équilibre. Une pointe couronnera le tout.
- L'entreprise se coordonnera avec le maçon et le charpentier pour découvrir si possible la chapelle Saint-Antoine pour vérification des bois (calendrier à préciser).

Entreprise BATTAIS CHARPENTE

- Monsieur Bouchard se coordonne avec l'entreprise RENÉ CARRÉ pour l'examen des charpentes et son intervention dès la découverte.
- Examiner la raison du déport du faitage de la chapelle Saint-Antoine par rapport aux témoins d'origine sur les murs de wimbergue.

Calendrier

Monsieur Heux mettra à jour le calendrier général en tenant compte des précisions des entreprises et des congés de fin d'année.

.../...

L'ACMH Présent

Documents remis

Interventions à venir



E. PONCELET - SOMVILLE
ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
XIV rue du GROS GERARD 59000 LILLE
TEL. : 03.20.31.58.81

NORD

STEENE

EGLISE SAINT - MARTIN

34214

3

RAPPORT de CHANTIER

Le 25 novembre 2020

2

PRESENTS

.../...

Coordonnateur Sécurité et Prévention de la Santé

- Monsieur Laverat fait l'inspection commune avec les entreprises.
- Il rappelle aux entreprises qu'elles doivent transmettre leurs Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé.





DIFFUSION




L'ACMH Présent

Documents remis

Interventions à venir

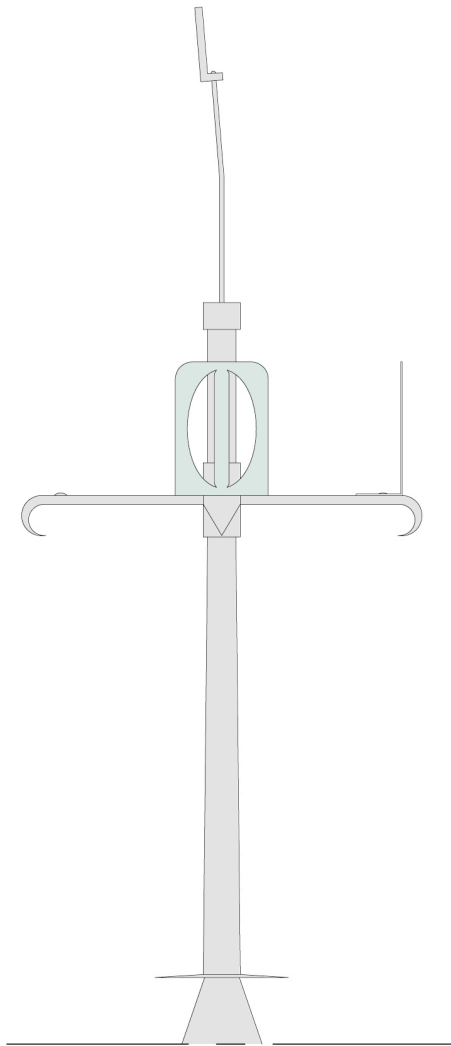

Etat existant

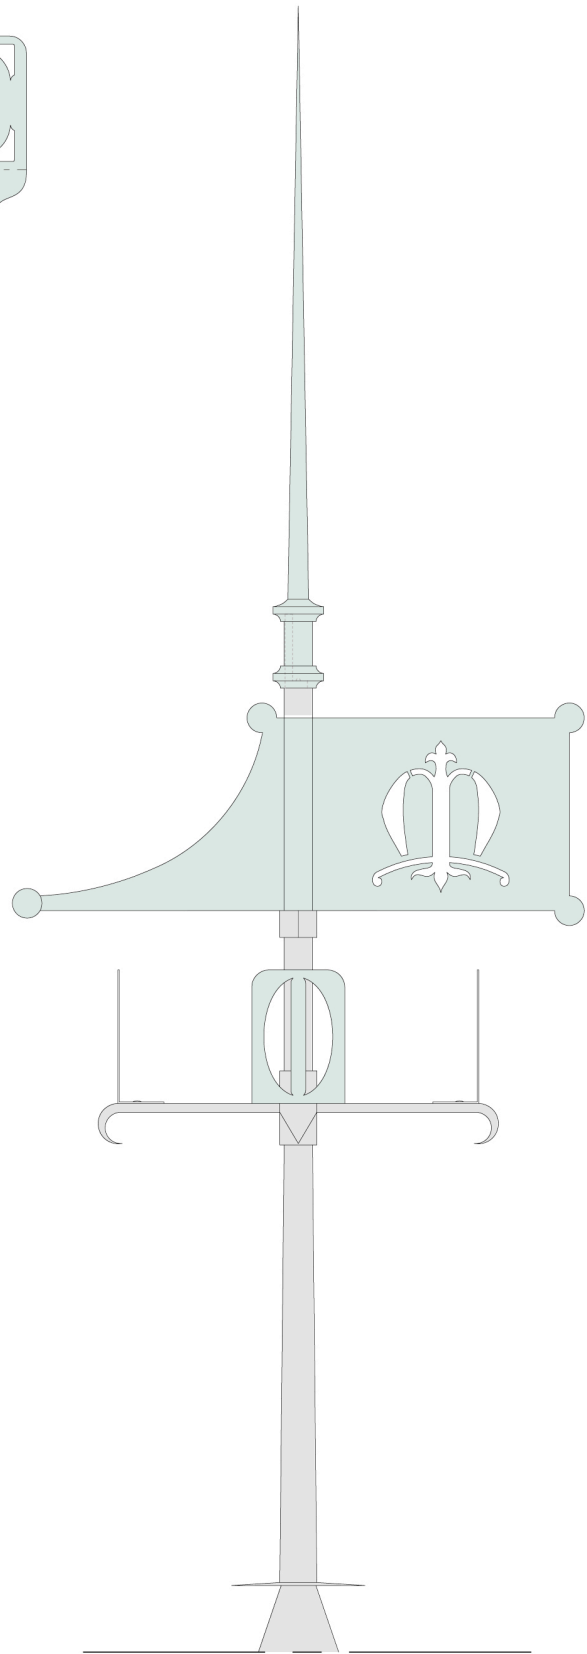

Projet
