Sorégies Groupe	RAPPORT MENSUEL DE PRODUCTION	juin 25
	7025 - Ecole - CHAMPAGNE SAINT HILAIRE	

Rédacteur	Vérification	Date
Marc GUILLOT-GAZEAU	Thierry ROCHEREAU	17/07/2025

1. Synthèse mensuelle

Caractéristiques du parc		Résultats	juin		Cumulé annuel	
			[MWh]	[Euros]	[MWh]	[Euros]
Nombre de systèmes:	1	Budget:	9	5 461	31	19 101
Surface totale [m2]:	392	Production:	7	4 443	31	19 422
Puissance totale [kWc]:	55	Ecart:	-19 %	-19 %	2 %	2 %
Ensoleill. mensuel/normal:	116 %	Gisement:	10		33	
Ensoleill. cumulé/normal:	114 %	Perf. du parc:	74 %		94 %	

Production : énergie relevée au compteur sur la période

Budget : énergie estimée en prévision budgétaire annuelle:

Gisement (PV) : productible installateur x coefficient d'ensoleillement

Mois	Valeurs mensuelles [MWh]			Valeurs cumulées [MWh]		
	Production	Budget	Gisement	Production	Budget	Gisement
janv.	2,2	1,5	1,6	2,2	1,5	1,6
févr.	3,5	2,6	3,2	5,7	4,2	4,8
mars	5,2	4,4	4,5	10,9	8,5	9,2
avr.	6,1	5,8	5,9	17,0	14,4	15,1
mai	7,0	7,4	8,3	23,9	21,8	23,4
juin	7,1	8,7	9,5	31,0	30,5	33,0
juil.		8,2			38,7	
août		7,1			45,8	
sept.		5,1			50,9	
oct.		3,2			54,1	
nov.		1,8			55,9	
déc.		1,3			57,2	

2. Analyse

Commentaires

Pour le mois de juin 2025 :

L'écart de production (mensuel) par rapport au budget (mensuel) est de : -19%.

L'écart de production (annuel) par rapport au budget (annuel) est de 2%.

La performance du parc est de 74%. C'est-à-dire que la production est inférieure de 26% par rapport au gisement météo.

La performance cumulée annuelle est de 94%.

La performance net est de 74%.

L'ensoleillement mensuel est de 116%, c'est-à-dire que la puissance radiative est supérieure de 16% par rapport aux normales historiques de Météo France.

Avec un taux d'ensoleillement favorable au mois de juin, la production n'atteint pas le budget attendu.

Elle représente 12.41% du budget annuel.

Evènements

RAS

Sécurité

RAS

Environnement

RAS

3. Production de l'ensemble du parc

Comparaison production, budget, gisement en MWh (parc total)

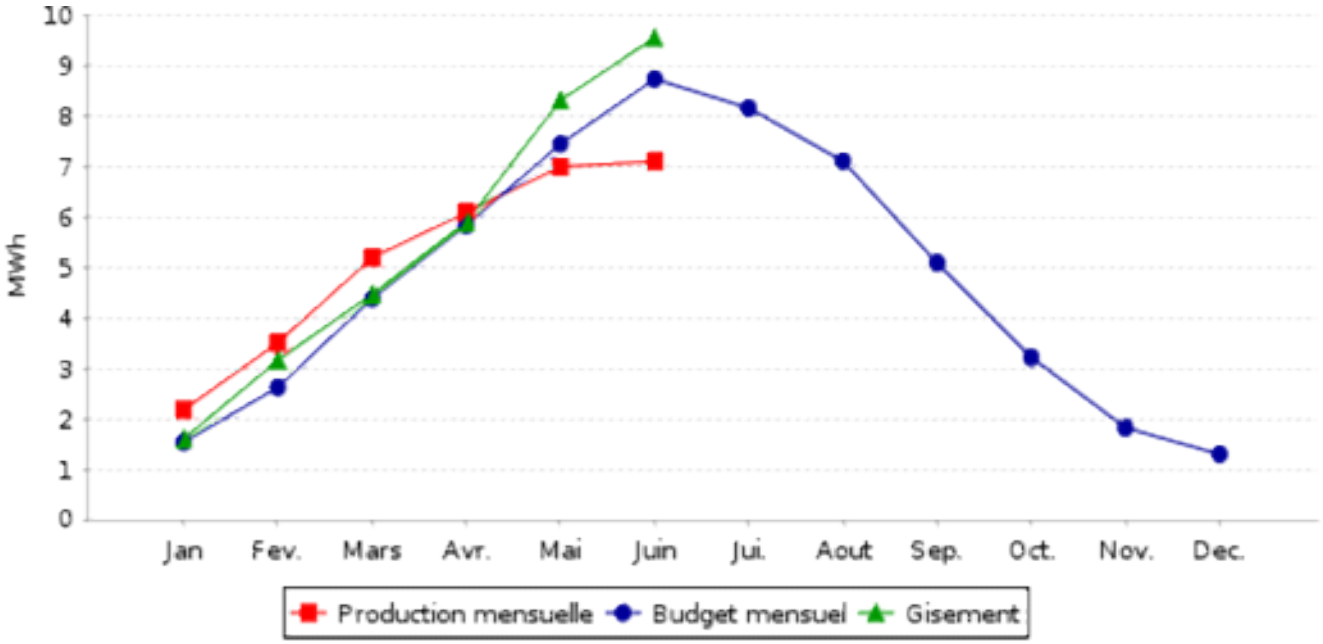

Cumul production, budget, gisement en MWh (parc total)

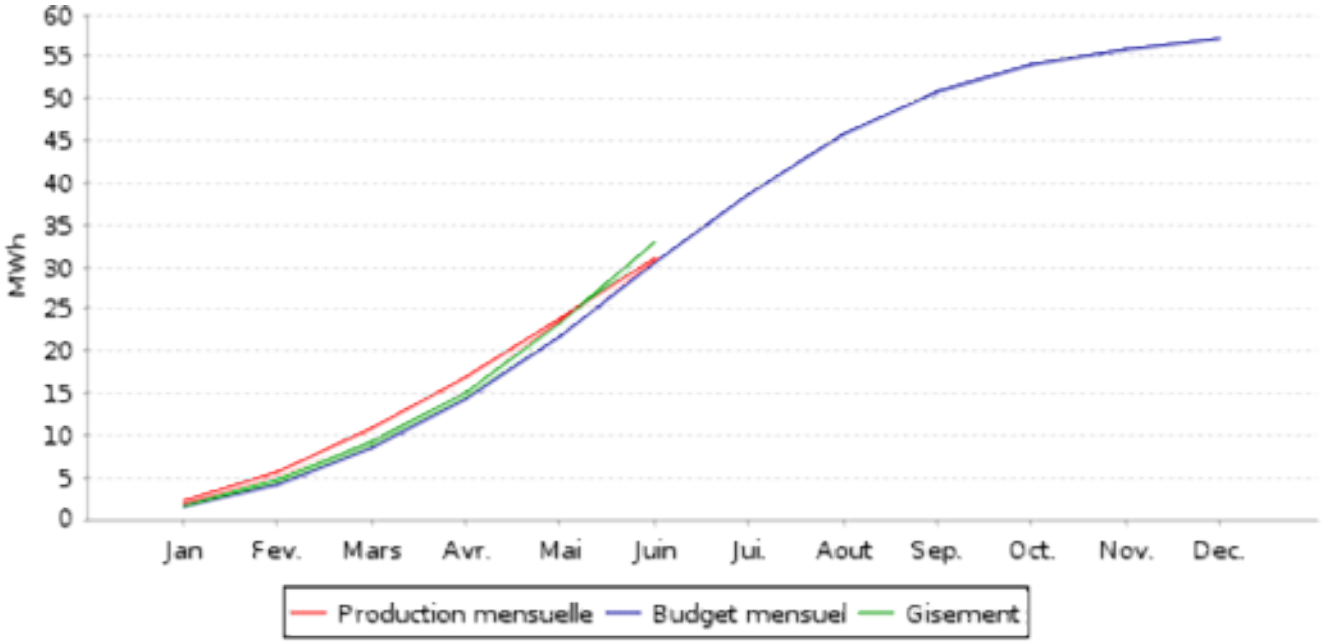

4. Performance des installations

Performance par installation (production/gisement)	Mois	Année
7025 - Ecole - CHAMPAGNE ST HILAIRE	74 %	94 %
